



**VERBALE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: "RIPRISTINO OPERE E SEZIONE DI DEFLUSSO CANALI E CORSI D'ACQUA DEL PADULE DI SOVICILLE - COMUNE DI SOVICILLE".**

(Art. 163 comma 1 - D. Lgs. 18.04.2016 n° 50)

Le eccezionali precipitazioni atmosferiche abbattutesi nel comprensorio del Consorzio 6 Toscana sud nei giorni 15-19 novembre 2019 hanno determinato un grave stato di pericolosità.

Il risultato di tale evento ha fatto verificare una piena eccezionale, provocando fenomeni di esondazione diffusa nel bacino del padule di Sovicille.

In Conseguenza a quanto sopra riportato il giorno 02 dicembre 2019, il sottoscritto Ing. Renzo Ricciardi, in qualità di Dirigente Settore del Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana, unitamente al Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud Arch. Fabio Zappalorti ha condotto un sopralluogo nelle aree appartenenti al padule di Sovicille.

Nel corso di tali verifiche è stato possibile riscontrare la presenza di numerose erosioni spondali dovute alle esondazioni sui corsi d'acqua del padule di Sovicille, in particolare sul Fosso Luchetto, Fosso Luco, Torrente Rosia e Torrente Serpenna.

In ragione di quanto verificatosi, si ritiene necessaria l'immediata attivazione delle opere di ripristino in regime di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio pubblico e privato.

Visto quanto sopra esposto, preso atto della situazione e concordata con il Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud la strategia d'intervento, il Sottoscritto Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud, Ing. Renzo Ricciardi, ritiene di affidare, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, al CB6 Toscana Sud l'esecuzione dei lavori strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

I lavori necessari concordati con il Consorzio di Bonifica consistono in:

- Rimozione di alberature deperenti e depositi di vegetazione che hanno prodotto ostruzioni di corsi d'acqua con erosioni localizzate e allagamenti (Foto n.6-7-8);
- Riprofilatura del fondo e delle scarpate, ripristini localizzati di erosioni spondali dei corsi d'acqua in modo da ripristinare le originali sezioni di deflusso (Foto n.1-2-3-4-5);
- Ricostruzione della chiusura del collegamento del canale "Bypass" con il Luchetto in massi ciclopici;
- Riescavo della sezione compromessa di dilavamento delle superfici agrarie del canale Bypass e del canale Cannaio;
- Riprofilatura del reticolo minore completamente distrutto dall'onda di piena al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza alla viabilità pubblica ed alle abitazioni insistenti sul territorio.

Ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il Consorzio dovrà trasmettere entro 10 giorni la perizia giustificativa dei lavori, corredata dall'eventuale verbale di concordamento dei prezzi e dal cronoprogramma procedurale e finanziario al Settore Genio Civile il quale, previa verifica della coerenza con quanto riportato nel presente verbale e della congruità dei prezzi, provvederà alla copertura della spesa.

Il Consorzio provvederà, inoltre, a propria ed esclusiva cura, responsabilità ed oneri, agli ulteriori adempimenti previsti



dall'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché all'eventuale acquisizione delle autorizzazioni necessarie, dandone contestuale comunicazione al Settore del Genio Civile.

Le opere da realizzare sono stimate in euro 70.000,00, consensualmente con l'affidatario con riferimento ai prezzi unitari previsti nel "Prezziario della Regione Toscana" o, qualora non presenti, ad altri prezziari ufficiali o specifiche analisi fondate su prezzi di mercato, applicando comunque il metodo previsto all'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Il Sottoscritto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi

**DICHIARA**

che i lavori indicati in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e

**AFFIDA**

al Consorzio 6 Toscana sud l'immediata esecuzione dell'intervento "Ripristino opere e sezione di deflusso canali e corsi d'acqua del padule di Sovicille - Comune di Sovicille" nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle premesse richiamato.

L'esecuzione dei suddetti lavori affidati al Consorzio 6 Toscana Sud saranno realizzati in parte dal Consorzio con propri mezzi e operai in parte alle seguenti imprese, dotate di mezzi idonei, le quali si sono rese immediatamente disponibili:

- Moscatelli Gianni e Gabrio snc

Letto, approvato e sottoscritto

Grosseto, li 02 dicembre 2019

Per il Genio Civile Toscana Sud  
Il Dirigente Responsabile Ing. Renzo Ricciardi

Per il Consorzio 6 Toscana Sud  
Il Direttore Generale Arch. Fabio Zappalorti



**"RIRPISTINO OPERE E SEZIONE DI DEFLUSSO CANALI E CORSI D'ACQUA DEL PADULE DI SOVICILLE - COMUNE DI SOVICILLE".**



*Foto 1 - Vista Fosso dell'Arnone*




*Foto 2 - Vista Fosso Luchetto*



*Foto 3 - Vista Fosso Luchetto*



*Foto 4 - Vista Fosso Luco*

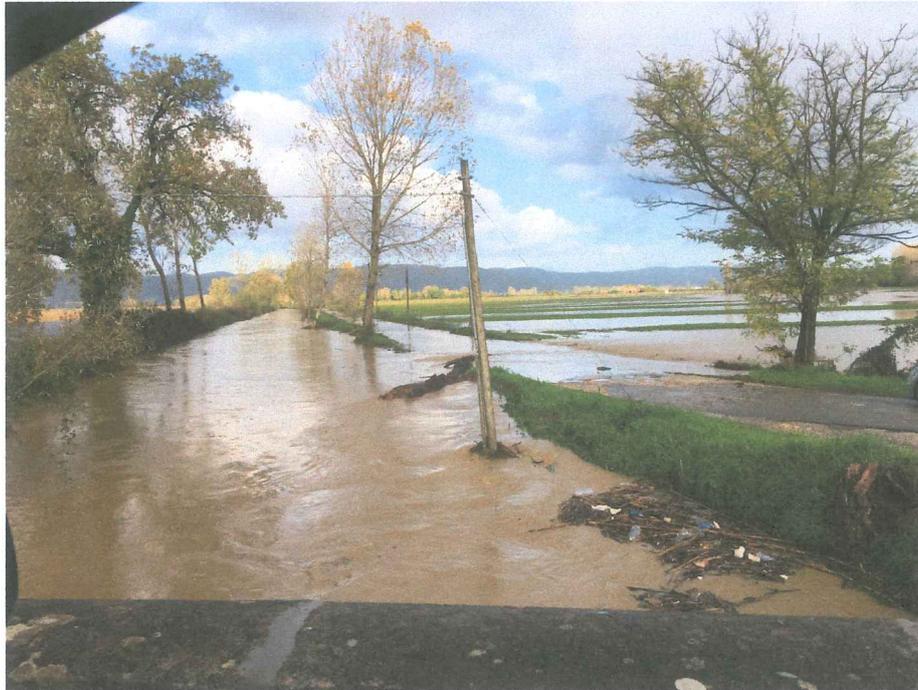

*Foto 5 - Vista Torrente Rosia*



*Foto 6 - Vista Torrente Serpenna*



*Foto 7 - Vista Torrente Serpenna*



*Foto 8 - Vista Torrente Serpenna*

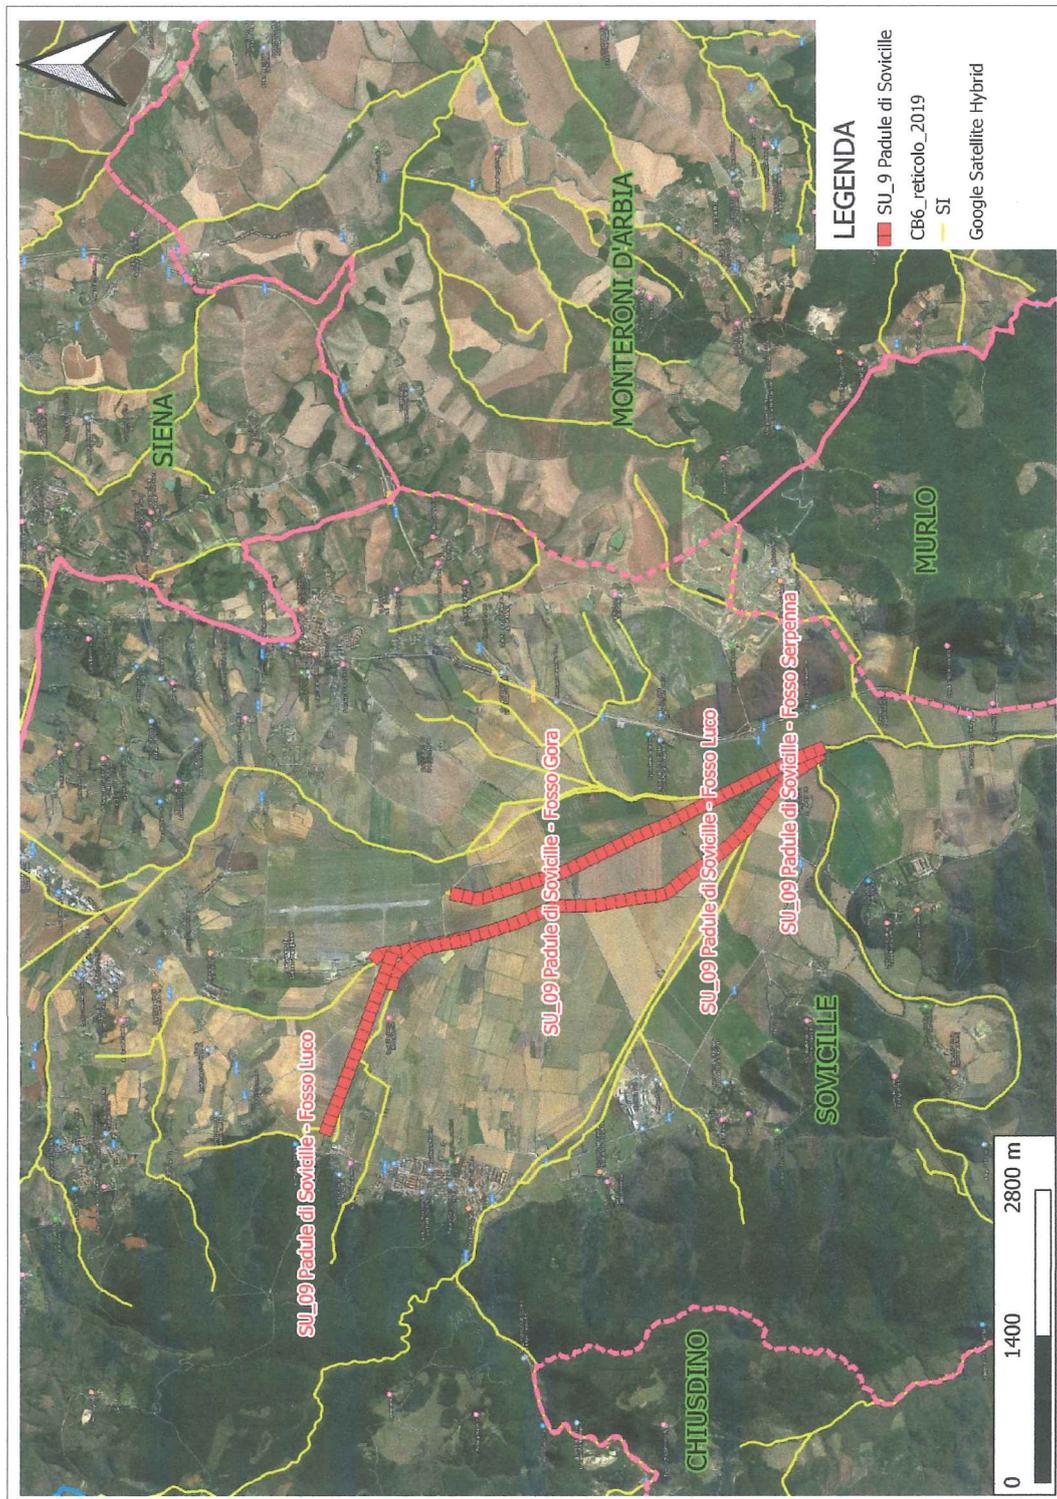


Fig.1 - Planimetria area di intervento
